

道営工業用水道

室蘭地区工業用水道 第三期改修事業について



その先の、道へ。北海道
Hokkaido. Expanding Horizons.

平成31年3月
北海道企業局









事業概要


- ・室蘭工水では、平成23年度から老朽化が著しい配水管の更新及び耐震化を目的とする調査設計に着手。
- ・平成25年度に改修工事に着工し、平成31年度に改修工事及び事業の完了を予定。

事業計画

- ・総事業費： 約53億円
（平成31年度事業費に対し、国庫補助を要望）
- ・事業期間： 平成23年度～平成31年度

| | H23 (2012) | H24 (2013) | H25 (2014) | H26 (2015) | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | H31 (2019) | |
|--------------------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|--|
| 室蘭幹線(輪西地区) φ800 L=約1.9km | 実施設計  | | 工事施工  | | | | | | | |
| 室蘭幹線(登別地区) φ1350ほか L=約1.3km | 実施設計  | | 工事施工  | | | | | | | |
| 本輪西日石線 φ600 L=約2.8km | | | | | 実施設計  | | 工事施工  | | | |
| 断水工事 | | | | | ● | ● | | ● | | |
| 補助金の取扱い | 継続事業 | | | | | | 単年度・新規事業 | | | |

事業計画

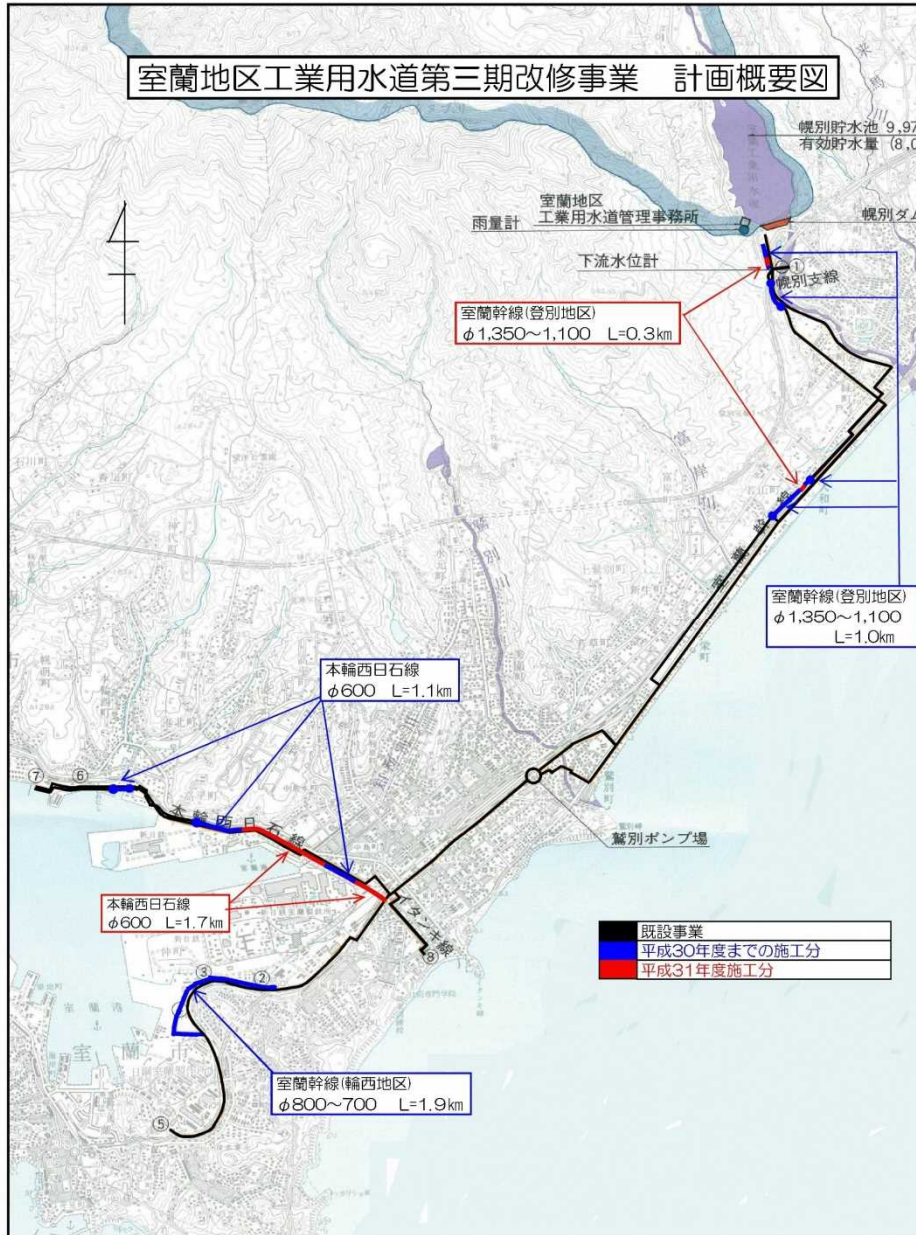

進捗状況 進捗率67%(H30時点見込み)

| 施工区間 | 施工状況 | 施工延長(km) | | | H30時点 進捗率(%) (見込み) |
|------------|------|----------|----------------|-------------|--------------------------|
| | | 地区延長 | H30まで (見込み) | H31 (予定) | |
| 室蘭幹線(輪西地区) | | 1.9 | 1.9 | — | 100 |
| 室蘭幹線(登別地区) | | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 77 |
| 本輪西日石線 | | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 39 |
| 合計 | | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 67 |

平成31年度事業内容(予定)

【配水管布設工事】

室蘭幹線(登別地区) 約0.3km

本輪西日石線 約1.7km

(実施区間は、図面内の赤実線)
